
7.2 ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Gestionar riesgos técnicos, organizacionales y metodológicos que puedan afectar el cronograma, la calidad, la arquitectura, la evaluación y la integración con las pasarelas de pago.

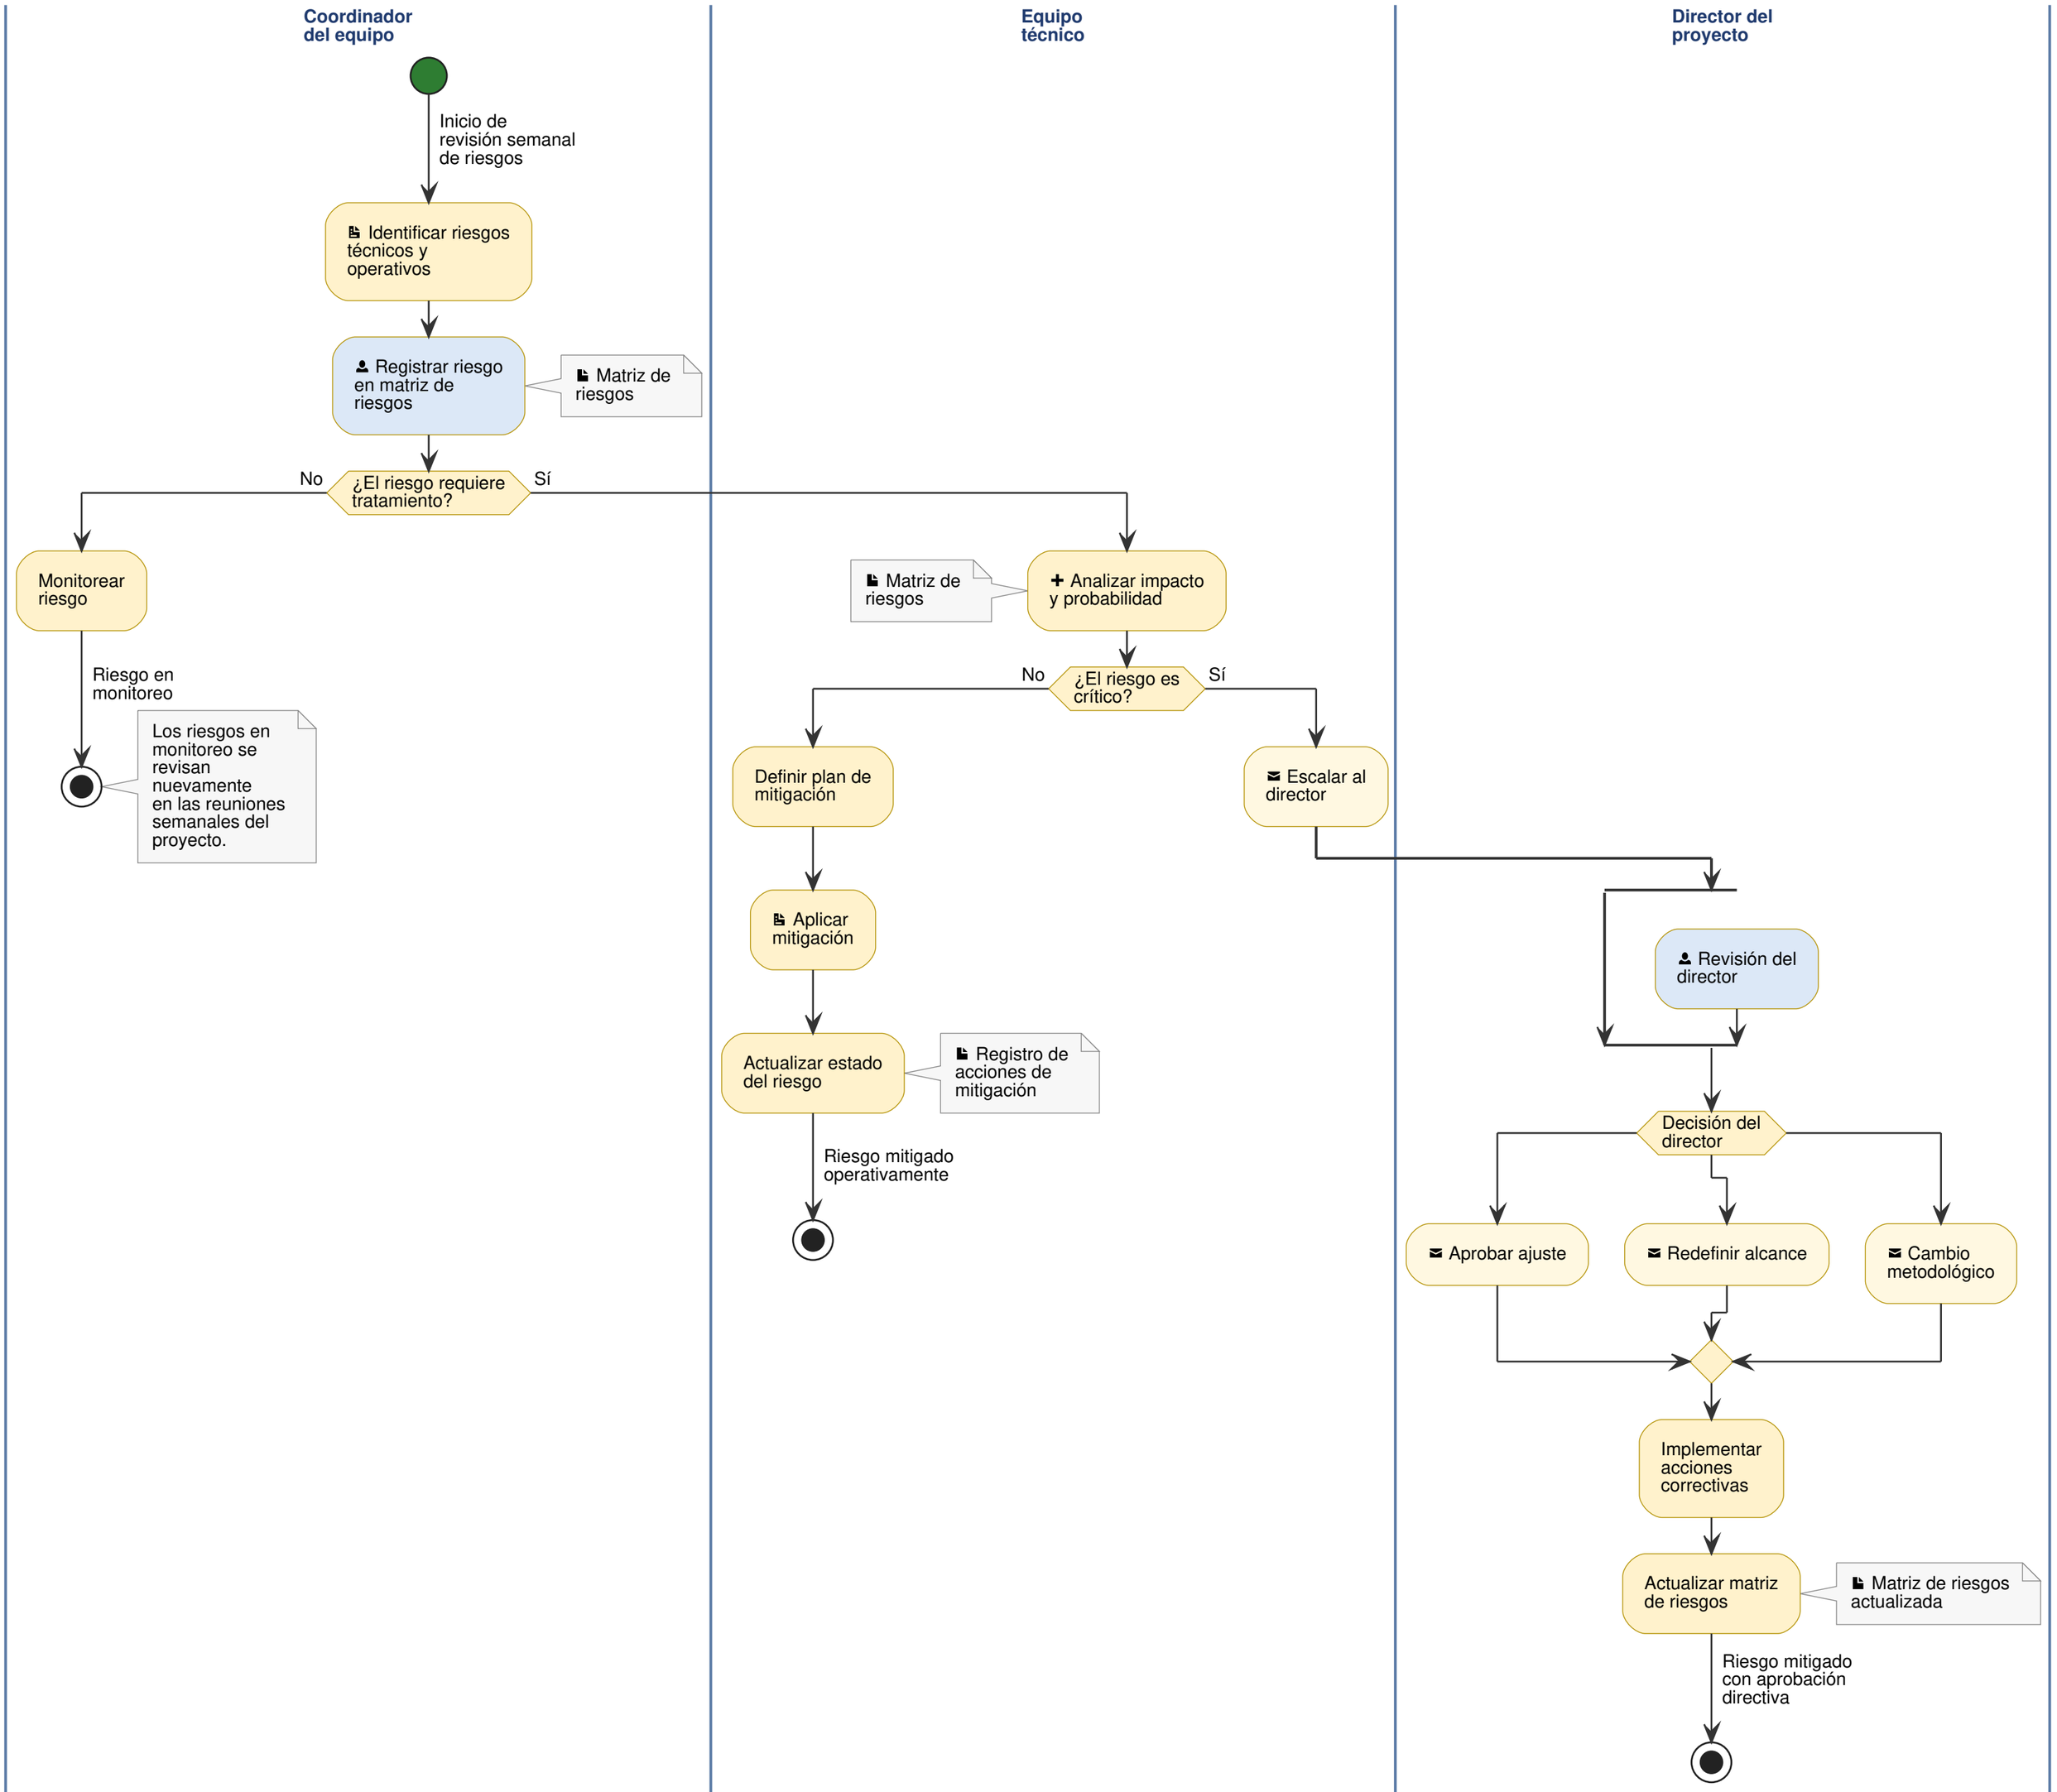

Símbolos	EXPLICACIÓN DEL PROCESO
Tarea de Usuario (azul) Tarea Manual Subproceso Evento de Mensaje Rombo o hexágono: Exclusiva (XOR) Objeto de Datos Nota: Anotación Textual Flecha continua: Flujo de Secuencia Flecha discontinua: Flujo de Mensaje	El proceso inicia en las revisiones semanales donde el equipo identifica riesgos técnicos, organizacionales o metodológicos. Estos se registran en la matriz de riesgos gestionada por el coordinador. Se evalúa si el riesgo requiere tratamiento según su impacto potencial en el alcance, el cronograma, la evaluación o la calidad del proyecto. Si no requiere tratamiento, se monitorea y se revisa nuevamente en las reuniones semanales. Si requiere tratamiento, el equipo analiza su impacto y probabilidad para determinar si es crítico. Si no es crítico, se define y aplica un plan de mitigación y se actualiza el estado del riesgo. Si es crítico, se escala al director del proyecto. El director revisa la situación y decide entre aprobar ajustes, redefinir alcance o cambiar aspectos metodológicos. Finalmente, se implementan las acciones correctivas y se actualiza la matriz de riesgos. Este proceso es continuo y se repite durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Notas:	
	Este proceso se ejecuta de forma continua durante todo el ciclo de vida del proyecto y se revisa en cada iteración o hito definido (H1-H6). La matriz de riesgos es el artefacto central para el seguimiento y control de los riesgos del proyecto.
